

浙江中盟电力设备有限公司
年产 800 吨变压器铁芯项目
竣工环境保护验收监测表

QX(竣)20220401

建设单位：浙江中盟电力设备有限公司

编制单位：浙江齐鑫环境检测有限公司

二〇二二年四月

建设单位法人代表：章杜斌

编制单位法人代表：蒋国龙

项目负责人：唐茵

报告编写人：唐茵

建设单位：浙江中盟电力设备有限公司

电话：15057775179

传真：/

邮编：323000

地址：浙江省丽水市莲都区南明山街道仙霞路101号

编制单位：浙江齐鑫环境检测有限公司

电话：0578-2303512

传真：0578-2303507

邮编：323000

地址：浙江省丽水市莲都区丽南花苑1幢三层

目 录

| | |
|----------------------------------|----|
| 一、建设项目概况 | 1 |
| 二、项目建设情况 | 4 |
| 三、环境保护设施 | 9 |
| 四、建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定 | 13 |
| 五、验收监测质量保证及质量控制 | 16 |
| 六、验收监测内容 | 18 |
| 七、验收监测结果 | 19 |
| 八、验收监测结论 | 23 |
| 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表 | 25 |
| 附件 1：项目所在地示意图 | 26 |
| 附件 2：审批项目批复 | 27 |
| 附件 3：营业执照 | 28 |
| 附件 4：企业排污许可回执 | 29 |

一、建设项目概况

| | | | | | |
|--------------|--|--------------|--------------------------|----|-------|
| 建设项目名称 | 年产 800 吨变压器铁芯项目 | | | | |
| 建设单位名称 | 浙江中盟电力设备有限公司 | | | | |
| 建设项目性质 | 新建 | | | | |
| 建设地点 | 浙江省丽水市莲都区南明山街道仙霞路 101 号 | | | | |
| 主要生产内容 | 变压器铁芯 | | | | |
| 设计生产能力 | 年产 800 吨变压器铁芯 | | | | |
| 实际生产能力 | 年产 800 吨变压器铁芯 | | | | |
| 建设项目环评时间 | 2019 年 5 月 | 开工建设时间 | 2019 年 12 月 | | |
| 调试时间 | 2020 年 9 月 | 验收现场监测时间 | 2022 年 3 月 30 日、3 月 31 日 | | |
| 环境影响评价文件审批部门 | 丽水市生态环境局 | 环境影响评价文件编制单位 | 浙江中盟电力设备有限公司 | | |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / | | |
| 投资总概算 | 550 万元 | 环保投资总概算 | 5 万元 | 比例 | 0.91% |
| 实际总投资 | 560 万元 | 环保投资 | 9 万元 | 比例 | 1.61% |
| 验收监测依据 | <p>(1) 《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1 施行）；</p> <p>(2) 《中华人民共和国水污染防治法》（2018.1.1 施行）；</p> <p>(3) 《中华人民共和国大气污染防治法》（2016.1.1 施行）；</p> <p>(4) 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018.12.29 修订）；</p> <p>(5) 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.4.29 修订版）；</p> <p>(6) 《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》中华人民共和国国务院令（第 682 号）（2017.7.16 发布）；</p> <p>(7) 关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评[2017]4 号）；</p> <p>(8) 《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》；</p> <p>(9) 《浙江省建设项目环境保护管理办法》，省政府令第 364 号，</p> | | | | |

| | <p>2021.2.10 修正;</p> <p>(10) 《关于建设项目环保设施验收有关事项的通知》浙江省环境保护厅,浙环办函〔2017〕186号;</p> <p>(11) 丽水市生态环境局《浙江中盟电力设备有限公司年产 800 吨变压器铁芯项目备案通知书》丽环建备一开[2019]99号,2019年5月29日;</p> <p>(12) 《浙江中盟电力设备有限公司年产 800 吨变压器铁芯项目环境影响登记表》,浙江中盟电力设备有限公司,2019年5月。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------------------------|------------------|------|------------------|-----|----|-----|----|-----------------|-----|------|------|------|-----|-----|----|-----|-------------|--|-----|--------------------------|-----|----------|-----|
| <p>验收监测评价标准、标号、级别、限值</p> | <p>1、废水</p> <p>本项目产生的废水经预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准(其中氨氮排放执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中标准限值),纳入工业区污水管网,进入水阁污水处理厂处理;水阁污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准具体标准见表 1-1。</p> <p style="text-align: center;">表 1-1 项目废水排放标准 单位: mg/L (pH 除外)</p> <table border="1" data-bbox="469 1173 1458 1335"> <thead> <tr> <th>项目</th> <th>pH</th> <th>COD</th> <th>BOD₅</th> <th>SS</th> <th>氨氮</th> <th>石油类</th> <th>总磷</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GB8978-1996三级标准</td> <td>6~9</td> <td>≤500</td> <td>≤300</td> <td>≤400</td> <td>≤35</td> <td>≤20</td> <td>≤8</td> </tr> </tbody> </table> <p>2、废气</p> <p>无组织废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放监控浓度限值要求;详见表 1-2。</p> <p style="text-align: center;">表 1-2 《大气污染物综合排放标准》二级标准限值</p> <table border="1" data-bbox="469 1603 1458 1765"> <thead> <tr> <th rowspan="2">污染物</th> <th colspan="2">无组织排放监控浓度限值</th> </tr> <tr> <th>监控点</th> <th>浓度 (mg/Nm³)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>颗粒物</td> <td>周界外浓度最高点</td> <td>1.0</td> </tr> </tbody> </table> <p>3、噪声</p> <p>项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)的 3 类标准,见表 1-3。</p> <p style="text-align: center;">表 1-3 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 单位: dB(A)</p> | 项目 | pH | COD | BOD ₅ | SS | 氨氮 | 石油类 | 总磷 | GB8978-1996三级标准 | 6~9 | ≤500 | ≤300 | ≤400 | ≤35 | ≤20 | ≤8 | 污染物 | 无组织排放监控浓度限值 | | 监控点 | 浓度 (mg/Nm ³) | 颗粒物 | 周界外浓度最高点 | 1.0 |
| 项目 | pH | COD | BOD ₅ | SS | 氨氮 | 石油类 | 总磷 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GB8978-1996三级标准 | 6~9 | ≤500 | ≤300 | ≤400 | ≤35 | ≤20 | ≤8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 污染物 | 无组织排放监控浓度限值 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 监控点 | 浓度 (mg/Nm ³) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 颗粒物 | 周界外浓度最高点 | 1.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 类别 | 昼 间 | 夜 间 |
|----|-----|-----|
| 3类 | 65 | 55 |

4、固体废物

固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中相关规定。

二、项目建设情况

1、项目概况

浙江中盟电力设备有限公司看好变压器铁芯的市场发展前景，通过投资 560 万元，租用浙江永固输配电设备有限公司位于浙江省丽水市莲都区南明山街道仙霞路 101 号的部分厂房，租用建筑面积为 1134m²。采用先进的生产技术或工艺，购置先进的生产设备，建设年产 800 吨变压器铁芯项目。

项目于 2019 年在丽水经济技术开发区经济发展局登记备案（项目代码：项目代码：2019-331102-44-03-022455-000），2019 年 5 月，企业编制了《浙江中盟电力设备有限公司年产 800 吨变压器铁芯项目环境影响登记表》，并于 2019 年 5 月 29 日取得了丽水市生态环境局《浙江中盟电力设备有限公司年产 800 吨变压器铁芯项目备案通知书》丽环建备一开[2019]99 号文件。

依据国务院第 682 号令《建设项目环境保护管理条例》等相关规定，2022 年 2 月，浙江中盟电力设备有限公司委托浙江齐鑫环境检测有限公司（即我司）对该项目进行竣工环境保护验收监测。我司在研读项目建设及环保等相关资料基础之上，组织相关技术人员，对项目进行现场勘察和资料收集，在整理收集项目的相关资料后，编制了验收监测方案，并依据项目备案通知书和环评文件，于 2022 年 3 月 30 日、31 日进行现场监测。

项目竣工环境保护验收工作由浙江中盟电力设备有限公司负责组织，浙江齐鑫环境检测有限公司承担该项目验收监测和报告编制工作。

本次验收仅针对浙江中盟电力设备有限公司（地址：浙江省丽水市莲都区南明山街道仙霞路 101 号）年产 800 吨变压器铁芯项目的整体验收。

根据监测结果和整改结果，编制完成验收监测报告。

2、建设内容

浙江中盟电力设备有限公司位于浙江省丽水市莲都区南明山街道仙霞路 101 号，租用浙江永固输配电设备有限公司部分厂房作为生产车间，租用建筑面积为 1134m²，采用先进的生产技术和工艺，购置退火炉、硅钢片裁剪机、剪板机等先进的生产设备，形成年产 800 吨变压器铁芯的生产能力。项目总投资 560 万元，其中环保投资 9 万元。

2019 年 12 月项目开工建设，2020 年 9 月项目建设完成，并投入试生产。

项目工作制度及定员：企业全厂劳动定员约 20 人，一班制作业，每班工作 8 小时，年生产 300 天，厂区内不提供食宿。

表 2-1 产品一览表

| 项目 | 审批产能 | 设计产能 | 3月30日产量 | 3月31日产量 | 实际产能 |
|----|-------|--------|---------|---------|--------|
| 1 | 变压器铁芯 | 800吨/a | 2660千克 | 2662千克 | 800吨/a |

表 2-2 项目主要生产设备及说明

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号 | 设计数量(台/个) | 实际数量(台/个) | 备注 |
|----|---------|-----------------|-----------|-----------|----|
| 1 | 退火炉 | | 1 | 1 | 不变 |
| 2 | 剪板机 | Q11K—1.5×1000mm | 6 | 6 | 不变 |
| 3 | 开式可倾压力机 | J23-25 | 3 | 3 | 不变 |
| 4 | 硅钢片裁剪机 | zj1250 | 2 | 2 | 不变 |
| 5 | 测试机器 | | 1 | 1 | 不变 |
| 6 | 横剪机 | | 1 | 1 | 不变 |
| 7 | 纵剪机 | | 1 | 1 | 不变 |

表 2-3 原辅材料一览表

| 序号 | 名称 | 设计用量 | 实际用量 |
|----|-------|--------|----------|
| 1 | 绝缘硅钢片 | 801t/a | 802t/a |
| 3 | 水 | 300t/a | 260t/a |
| 4 | 电 | 25万度/a | 24.8万度/a |

3、地理位置及平面布置

(1) 地理位置

项目位于浙江省丽水市莲都区南明山街道仙霞路 101 号，项目周边为浙江永固输配电设备有限公司生产车间和园区道路。情况具体见表 2-4 和图 2-1。

表 2-4 项目周边情况一览表

| 浙江永固输配电设备有限公司 | 方位 | 概况 |
|---------------|----|-------------------|
| | 东侧 | 仙霞路，隔路为红日汽车电器有限公司 |
| | 南侧 | 特尔阀门有限公司 |
| | 西侧 | 友泰电气有限公司、永继电气有限公司 |
| | 北侧 | 惠民街，隔路为国工阀门集团 |

企业总租赁建筑面积为 1134m²，本项目主要分为一个生产车间。

(3) 周边污染情况

项目周边主要为轻工业企业，主要污染物为烟粉尘和少量有机废气。

4、主要工艺流程及产物环节

(1) 工艺流程简述




图 2-2 生产流程图

(1) 裁剪：外购硅钢片经裁剪机进行裁剪，其中大部分通过裁剪机、横剪机、斜剪机裁剪，小部分通过压力机进行压剪。

(2) 退火：将外购硅钢片至于退火炉（电加热）中进行退火，温度控制在 800℃，恒温加热 2h。经退火后消除残余应力，稳定尺寸。

(3) 叠装：人工将裁剪后的硅钢片进行叠装成型。

项目主要污染物及产生工序见表 2-5。

表 2-5 主要污染物及产生工序

| 污染物编号 | 污染物名称 | 产生工序 |
|-------|-------|----------|
| W1 | 生活废水 | 职工生活 |
| N | 机械噪声 | 生产过程机械噪声 |
| S1 | 金属边角料 | 生产过程 |
| S2 | 包装废物 | 原料拆包 |
| S3 | 生活垃圾 | 员工生活 |

4、水平衡




图 2-4 全厂水平衡图

5、项目变动情况

项目建设地点、性质、生产设备、原辅材料和工艺，基本符合环评及批复要求建设完成。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》判断，本项目无重大变动。

实际建设内容变更情况见表 2-6。

表 2-6 项目环评与实际建设内容对照表

| | | 环评中情况 | 项目实际情况 | 备注 |
|------|------|--|--|----|
| 项目选址 | | 浙江省丽水市莲都区南明山街道仙霞路 101 号 | 浙江省丽水市莲都区南明山街道仙霞路 101 号 | 一致 |
| 占地面积 | | 建筑面积 1134m ² | 建筑面积 1134m ² | 一致 |
| 主体工程 | 生产车间 | 1 个生产车间 | 1 个生产车间 | 一致 |
| 公用工程 | 供电 | 由市政供电 | 由市政供电 | 一致 |
| | 给水 | 由市政供水 | 由市政供水 | 一致 |
| | 排水 | 室外采用雨水、污水分流，室内污水、废水分流；雨水由雨水管道收集后排入工业区市政雨水管网；废水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准（其中氨氮排放执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中标准限值），纳入工业区污水管网，进入水阁污水处理厂处理；水阁污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准 | 厂区内雨污分流；雨水经雨水沟进入雨水管网；生活污水经化粪池预处理后纳入工业园区污水管网，最终进入水阁污水处理厂处理达标后排入大溪 | 一致 |
| | 其他 | 厂区内不设食宿 | 厂区内不设食宿 | 一致 |
| 环保工程 | 废水 | 生活污水 | 化粪池 | 一致 |
| | 噪声 | 高噪声设备设置减振基础和安装消声器；设置双层中空隔声玻璃窗；加强设备日常检修和维护；加强管理，教育员工文明生产 | 高噪声设备设置减振基础和安装消声器；车间内合理布局；生产设备均维护良好；加强员工操作管理 | 一致 |
| | 固体废物 | 设置一般固废堆放处、垃圾桶 | 设置一般固废堆放处、垃圾回收箱 | 一致 |

三、环境保护设施

1、废水

1.1 主要污染源

厂区雨水经雨水沟进入雨水管网管，外排废水仅为生活污水。

1.2 处理设施和排放

(1) 生活污水

项目劳动定员 20 人，生活污水约产生 208t/a。生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准（其中氨氮、总磷排放执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中标准限值）厂区内污水总排口（DW001）进入园区污水管网纳管，后进入由水阁污水处理厂处理达标后排放。

2、废气

(1) 裁剪粉尘

项目裁剪工序产尘较少，均自然沉降，通过加强车间通风，少量粉尘以无组织形式排放。



图 3-1 生产车间示意图

3、噪声

本项目噪声源主要产生于裁剪机等运行，噪声强度一般在 70~85dB（A）之间；企业主要通过以下措施来减少噪声排放：生产机械选购先进的低噪设备，对高噪设备安装减震器，车间内合理布局，对员工进行上岗培训。

4、固（液）体废物

项目故营运期间产生的固体废弃物主要包括金属边角料、废包装材料、职工生活垃圾。

(1) 金属边角料：主要为金工、切料过程产生的金属边角料，产生量约为 2t/a，收集后出售给废品收购单位。

(2) 废包装材料：产生于原料拆包，产生量约 0.8t/a。收集后委托环卫部门清运处置。

(3) 生活垃圾：生活垃圾产生量为 5t/a。收集后委托环卫部门清运处置。

项目固体废物产生量及处置方式具体情况见表 3-1。

表 3-1 项目固体废物情况一览

| 序号 | 固体废物名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 属性 | 危废代码 | 预测产生量 (吨/年) | 实际产生量 (吨/年) | 处置去向 |
|----|--------|------|----|-------|------|------|-------------|-------------|--------------|
| 1 | 金属边角料 | 裁板 | 固态 | 铁 | 一般固废 | / | 1 | 2 | 收集后出售给废品收购单位 |
| 2 | 废包装材料 | 原料拆包 | 固态 | 塑料、纸等 | 一般固废 | | 1 | 0.8 | 委托环卫部门清运处置 |
| 3 | 生活垃圾 | 职工生活 | 固态 | 塑料、纸等 | 一般固废 | / | 6 | 5 | |

5、其他环境保护设施

5.1 环境风险防范设施

(1) 企业员工均经过安全生产培训、生产技能培训和风险防范、应急培训后上岗，生产过程按照安全生产管理。

(2) 企业根据消防要求配备灭火器、消火栓等消防设备，同时定期进行检查，确保消防设施处于正常状况。

(3) 企业车间通风设备齐全，车间内空气流通顺畅。

(4) 企业年组织一次应急演练且制定大部分风险防范措施。

(5) 企业对生产设备和污水管道定期维护，车间地面已进行防腐防渗。

(6) 企业已制定环境风险规章制度和环境风险防范措施。

5.2 排污口

本项目厂区内所有外排废水通过一个排污口（DW001）进入园区污水管网纳管。

6、验收期间监测点位布局



*3月30日风向为北风，3月31日风向为北风

图 3-1 废水、废气、噪声监测点位示意图

7、环境管理检查结果

7.1 环保管理制度及人员责任分工

为加强环保管理，公司已配专人负责环保管理，负责固废收集和处置以及做好相应台帐记录，以保证环保措施落实到位。

7.2 监测手段及人员配置

企业暂无手工监测手段，厂区内产生的废水、废气等污染物按照自行监测要求，委托检测公司采样监测。

7.3 排污许可申报情况

企业已于 2020 年 7 月 25 日进行排污许可登记，有效期至 2025 年 7 月 24 日。

8、环保设施投资及“三同时”落实情况

项目总投资 560 万元人民币，其中环保投资 9 万人民币，占总投资的 1.61%，其中管道更新维护占 1 万元，通风设备占 3 万元，隔声降噪措施占 4 万元，其他占用 1 万元。具体投资情况见表 3-2。

表 3-2 实际环保投资情况一览表

| 序号 | 时段 | 污染物 | 环保投资项目 | 投资概算 | 实际投资 |
|----|----|-----|--------|------|------|
|----|----|-----|--------|------|------|

| | | | | | |
|----|-----|------|---------|---|---|
| 1 | 营运期 | 废水 | 管道更新 | 0 | 1 |
| 2 | | 废气 | 通风设备 | 0 | 2 |
| 3 | | 噪声 | 隔声降噪 | 3 | 5 |
| 4 | | 固体废物 | 固废收集、处置 | 2 | 1 |
| 合计 | | | | 5 | 9 |

四、建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

表 4-1 项目环评污染防治措施落实情况一览表

| 类别 | 排放源 | 污染物 | 环评设计环保设施与防治措施 | 实际治措施落实情况 |
|-------|-------|---|---|--|
| 水污染物 | 生活污水 | COD _{Cr} NH ₃ -N | 经化粪池预处理后，排入工业园区污水管网 | 经化粪池预处理后进入厂区污水总排口DW001排入工业园区污水管网进行纳管 |
| 大气污染物 | 裁剪 | 粉尘 | / | 车间通风，少量无组织排放 |
| 固体废物 | 金加工 | 金属边角料 | 外售废品回收单位 | 外售物资回收公司 |
| | 废包装材料 | 原料拆包 | 分类收集，委托环卫部门清运、处置 | 分类收集，委托环卫部门清运、处置 |
| | 职工生活 | 生活垃圾 | 分类收集，委托环卫部门清运、处置 | 分类收集，委托环卫部门清运、处置 |
| 噪声 | 生产线 | 机械噪声 | 高噪声设备设置减振基础和安装消声器；设置双层中空隔声玻璃窗；加强设备日常检修和维护；加强管理，教育员工文明生产 | 生产机械选购先进的低噪设备，对高噪设备安装减震器，车间内合理布局，对员工进行上岗培训 |

2、审批部门审批决定

浙江中盟电力设备有限公司年产 800 吨变压器铁芯项目环境影响评价文件备案通知书
编号:丽环建备一开[2019]99 号

浙江中盟电力设备有限公司:

你单位于 2019 年 5 月 29 日提交的浙江中盟电力设备有限公司年产 800 吨变压器铁芯项目环境影响登记表及建设项目环境影响评价文件备案承诺书、信息公开情况说明等材料收悉,经形式审查,同意备案。

建设项目在投入生产或者使用前,请你单位对照环评及承诺备案的要求,按国务院环境保护主管部门规定的标准和程序,对配套建设的环境保护设施进行验收,编制验收报告,并向社会公开验收报告。

丽水市生态环境局

2019 年 5 月 29 日

表 4-2 环评验收情况一览表

| 分类 | 环评要求 | 验收情况 | 备注 |
|------|--|--|----|
| 建设内容 | 浙江中盟电力设备有限公司年产800吨变压器铁芯项目选址位于丽水经济技术开发区仙霞路101号,租用浙江永固输配电设备有限公司部分厂房作为生产车间,租用建筑面积为1134m ² 。项目采用先进的生产技术或工艺,购置退火炉、硅钢片裁剪机、剪板机等先进的生产设备。项目建成后将形成年产800吨变压器铁芯的生产能力。项目估算总投资550万元; | 江中盟电力设备有限公司位于浙江省丽水市莲都区南明山街道仙霞路101号,租用浙江永固输配电设备有限公司部分厂房作为生产车间,租用建筑面积为1134m ² ,采用先进的生产技术和工艺,购置退火炉、硅钢片裁剪机、剪板机等先进的生产设备,形成年产800吨变压器铁芯的生产能力。项目总投资560万元,其中环保投资9万元; | 符合 |
| 废水 | 厂区实行雨污分流。生活废水须经厂区原有污水管网集中收集处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准和相应标准要求(如COD _{Cr} <500mg/L、BOD ₅ ≤300mg/L、石油类≤20mg/L、PH:6-9、NH ₃ -N≤35mg/L)后,纳入工业园区污水管网,由水阁污水处理厂处理达标后统一排放。外排废水必须设置规范的监视监测采样井; | 项目厂区内雨污分流;生活污水经化粪池预处理后进入厂内污水总排口纳管,外排废水中氨氮、总磷能达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)要求,其他指标能达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准要求; | 符合 |
| 废气 | / | 厂界无组织排放的颗粒物能达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中相应的无组织排放监控浓度限值要求; | 符合 |
| 噪声 | 合理布局高噪声源、妥善安排工作时段,并采取有效的隔音、降噪、减振措施,确保厂区厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)规定的厂界外声环境3类功能区标准要求,即昼间≤65分贝,夜间≤55分贝; | 通过一系列隔声降噪措施后,厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准限值; | 符合 |
| 固废 | 企业必须积极推行清洁生产,减少固体废物的产生量,生产工艺中产生的固废应尽量回收利用,金属边角料、包装废物等属于普通固废,必须按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)妥善收集、贮存,不得露天随意堆放,尽量综合利用;生活垃圾及时清运,纳入城市垃圾处理系统统一处理。 | 项目一般固体废弃物储存、处置能按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中的有关规定。 | 符合 |

五、验收监测质量保证及质量控制

1、监测分析方法和分析仪器

表 5-1 监测分析方法、仪器一览表

| 类别 | 检测项目 | 检测方法 | 主要仪器 | 检定有效期限 | 检出限 |
|-------|-------------|-----------------------------------|------------------------------|------------|-------------------------|
| 地表水 | pH值 | 水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020 | 便携式PH计 (PHB-4, S-X-047) | / | / |
| | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | 分光光度计 (722N, S-L-007) | 2023.01.06 | 0.025 mg/L |
| | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法HJ 828-2017 | 50ml棕色酸碱通用滴定管 | / | 4 mg/L |
| | 五日生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 | 液晶生化培养箱 (LRH-70, S-W-002) | 2023.03.17 | 0.5 mg/L |
| | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 | 分析电子天平 (AUW120D, S-L-019) | 2023.01.09 | 4 mg/L |
| | 石油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外光度法 HJ 637-2018 | 红外分光测油仪 (OIL480, S-L-011) | 2022.05.15 | 0.06 mg/L |
| | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法GB/T 11893-1989 | 分光光度计 (722N, S-L-007) | 2023.01.06 | 0.01mg/L |
| 无组织废气 | 颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法GB/T 15432-1995 | 分析电子天平 (AUW120D, S-L-019) | 2023.01.09 | 0.001 mg/m ³ |
| 噪声 | 工业企业厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 | 多功能声级计 (AWA5688, S-X-060) | 2022.04.13 | / |
| 备注 | “/”表示方法无检出限 | | | | |

2、人员能力

参加本次验收监测的人员均通过相关单位考核，做到了持证上岗，相关检测能力已具备。

3、水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

本次验收监测中水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《环境水质监测质量保证手册》(第四版)的要求进行。采样过程中已采集一定比例的平行样；实验室分析过程相关情况见表 5-2。

表 5-2 水质质控数据分析表

| 现场平行结果评价 | | | | |
|----------|----------------|--------------|-------------|------|
| 分析项目 | 样品浓度 (mg/L) | 平行样 相对偏差% | 允许 相对偏差% | 结果评价 |
| pH | 6.9 | / | / | / |
| | 6.9 | | | |
| 五日生化需氧量 | 115 | 1.7 | ≤20 | 合格 |

| | | | | |
|----------------|--------------------------|------------------------|----------------------|-------------|
| | 113 | | | |
| 化学需氧量 | 368 | 1.6 | ≤10 | 合格 |
| | 374 | | | |
| 氨氮 | 13.7 | 0 | ≤10 | 合格 |
| | 13.7 | | | |
| 质控样结果评价 | | | | |
| 分析项目 | 质控样编号 | 样品浓度 (mg/L) | 定值 (mg/L) | 结果评价 |
| 氨氮 | GSB07-3164-2014/2005115 | 5.388 | 5.29±0.21 | 合格 |
| 化学需氧量 | GSB07-3161-2014 M2001127 | 189 | 188±8 | 合格 |
| 总磷 | BW085527/180514 | 0.131 | 0.137±0.007 | 合格 |

5、气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

监测仪器均符合国家有关标准或技术要求，监测人员持证上岗；监测前对使用的仪器均进行了流量和浓度校正，采样和分析过程严格按照《空气和废气监测分析方法》进行。

6、噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

噪声监测时严格按照《环境监测技术规范》（噪声监测部分）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的有关规定进行监测。

声级计在监测前后用标准发声源进行校准，附噪声仪器校验表。

表 5-3 噪声仪器准确度校准

| 声级计编号 | 声校准器定值 | 测量器定值 | 测量后定值 | 允许差值 | 校准结果判定 |
|---------|--------|-------|-------|------------|--------|
| S-X-060 | 94.0 | 93.8 | 93.8 | ± 0.5dB(A) | 符合要求 |

六、验收监测内容

1、废水

表 6-1 废水监测内容一览表

| 污染源及监测点位 | 监测指标 | 监测频次 |
|---------------|----------------------------|-------------|
| 污水总排口 (DW001) | pH、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、悬浮物、总磷 | 连续监测2天，每天4次 |

2、废气

表 6-2 无组织废气监测内容一览表

| 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 | 监测周期 |
|---------------|------|------|------|
| 厂界上风向 (WQ001) | 颗粒物 | 4次/天 | 2 天 |
| 厂界下风向 (WQ002) | | | |

3、厂界噪声

表 6-4 噪声监测内容一览表

| 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 | 监测周期 |
|--------------|------|------------|------|
| 厂界东侧 (ZS001) | 噪声 | 昼 各1次/天 | 2天 |
| 厂界南侧 (ZS002) | | | |
| 厂界西侧 (ZS003) | | | |
| 厂界北侧 (ZS004) | | | |

4、固废调查

调查固体废弃物是否执行调查固体废弃物是否执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中的有关规定，危险废物是否执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单中相关规定。

七、验收监测结果

1、验收监测期间生产工况记录

浙江中盟电力设备有限公司年产 800 吨变压器铁芯项目竣工环境保护验收监测日期为 2022 年 3 月 30 日和 3 月 31 日。监测期间，企业生产照常，各环保设施正常运作。具体监测期间工况表见表 7-1、表 7-2。

表 7-1 项目监测期间主要产量、能耗、辅助材料一览表

| 日期 | | 2022 年 3 月 30 日 | 2022 年 3 月 31 日 |
|------|-------|-----------------|-----------------|
| 生产能力 | 变压器铁芯 | 设计日生产能力 | 2666.7 千克 |
| | | 实际日生产能力 | 2660 千克 |
| 耗能 | 用水量 | 0.86 吨 | 0.86 吨 |
| | 用电量 | 824.3 度 | 826.1 度 |
| 原辅材料 | 绝缘硅钢片 | 2663 千克 | 2665 千克 |

表 7-2 气象参数

| 采样点位 | 检测时间 | 风向 | 风速 (m/s) | 气温 (°C) | 气压 (KPa) | 天气情况 |
|------------------|----------|----|----------|---------|----------|------|
| 厂界上风向 (WQ001) | 3 月 30 日 | 北 | 0.8 | 18.5 | 101.7 | 晴 |
| | 3 月 31 日 | 北 | 1.0 | 18.4 | 101.7 | 阴 |
| 厂界下风向 (WQ002) | 3 月 30 日 | 北 | 0.8 | 18.6 | 101.7 | 晴 |
| | 3 月 31 日 | 北 | 1.0 | 18.4 | 101.7 | 阴 |

2、废水监测结果

2022 年 3 月 30 日~3 月 31 日，对该项目污水总排口（DW001）进行了监测。监测结果及达标情况见表 7-3。

表 7-3 污水总排口废水监测结果 单位：mg/L（除 pH 外）

| 采样日期 | 2021 年 3 月 30 日~3 月 31 日 | | | | | | | | | |
|---------------|--------------------------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|---------|-----|
| 分析日期 | 2021 年 3 月 30 日~4 月 4 日 | | | | | | | | | |
| 检测项目 | 3 月 30 日 | | | | 3 月 31 日 | | | | 平均值 | 标准值 |
| | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | | |
| 样品性状 | 微黄微浑 | 微黄微浑 | 微黄微浑 | 微黄微浑 | 微黄微浑 | 微黄微浑 | 微黄微浑 | 微黄微浑 | / | / |
| pH 值（无量纲） | 7.0 | 7.1 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 7.0 | 7.1 | 7.0 | 6.9~7.1 | 6-9 |
| 化学需氧量（mg/L） | 370 | 375 | 373 | 371 | 376 | 369 | 372 | 377 | 373 | 500 |
| 五日生化需氧量（mg/L） | 114 | 113 | 112 | 114 | 112 | 111 | 112 | 115 | 113 | 300 |
| 氨氮（mg/L） | 14.0 | 13.2 | 14.5 | 13.7 | 14.2 | 13.4 | 12.9 | 13.2 | 13.6 | 35 |
| 悬浮物（mg/L） | 19 | 25 | 23 | 21 | 21 | 25 | 24 | 20 | 22 | 400 |
| 石油类（mg/L） | 1.19 | 1.19 | 1.24 | 1.26 | 1.80 | 1.93 | 1.80 | 1.80 | 1.53 | 20 |
| 总磷（mg/L） | 1.450 | 1.430 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.460 | 1.450 | 1.450 | 1.449 | 8 |

监测结果表明：本项目污水总排口 DW001 废水中 pH 值范围、化学需氧量、悬浮物、五日生化需氧量、石油类浓度均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中所要求的三级标准要求，氨氮、总磷浓度达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中相应要求。

3、废气监测结果

2022 年 3 月 30 日~3 月 31 日，对项目无组织废气污染物排放进行了连续 2 天监测，监测点位为无组织排放源上风向（WQ001）、下风向（WQ002）。无组织废气监测结果见表 7-4，气象参数见表 7-2。

表 7-4-1 无组织废气监测结果（单位： mg/m^3 ）

| 采样点位 | 采样日期 | 采样频次 | 颗粒物 (mg/m^3) |
|---------------|----------|------|--------------------------------|
| 厂界上风向 (WQ001) | 3 月 30 日 | 第一次 | 0.071 |
| | | 第二次 | 0.053 |
| | | 第三次 | 0.071 |
| | | 第四次 | 0.071 |
| | 3 月 31 日 | 第一次 | 0.106 |
| | | 第二次 | 0.124 |
| | | 第三次 | 0.142 |
| | | 第四次 | 0.107 |
| 厂界下风向 (WQ002) | 3 月 30 日 | 第一次 | 0.355 |
| | | 第二次 | 0.337 |
| | | 第三次 | 0.355 |
| | | 第四次 | 0.302 |
| | 3 月 31 日 | 第一次 | 0.319 |
| | | 第二次 | 0.284 |
| | | 第三次 | 0.320 |
| | | 第四次 | 0.320 |

表 7-4-2 无组织废气中监控点达标情况

| 污染物 | 参照点最小浓度 (mg/m^3) | 监控点最大浓度 (mg/m^3) | 差值 (mg/m^3) | 标准值 (mg/m^3) | 达标情况 |
|-----|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------|
| 颗粒物 | 0.071 | 0.355 | 0.284 | 1.0 | 达标 |

监测结果表明：厂界无组织废气监控点的颗粒物浓度与参照点浓度差值均能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值。

4、噪声监测结果

2022 年 3 月 30 日~3 月 31 日，对本项目噪声排放进行了 2 天监测，监测点位为厂界东侧（ZS001）、南侧（ZS002）、西侧（ZS003）、北侧（ZS004）。噪声监测分析结果见表 7-5。

表 7-5 噪声监测结果

| 检测日期 | | 3 月 30 日 | 3 月 31 日 |
|----------|------|---------------|---------------|
| 检测点位 | 主要声源 | 昼间 Leq[dB(A)] | 昼间 Leq[dB(A)] |
| 厂界东侧（Z1） | 机械噪声 | 63.1 | 62.3 |
| 厂界南侧（Z2） | 机械噪声 | 62.7 | 63.4 |
| 厂界北侧（Z4） | 机械噪声 | 63.7 | 63.7 |
| 厂界西侧（Z3） | 机械噪声 | 63.5 | 62.6 |
| 标准值 | | 65 | 65 |

监测结果表明：本项目厂界四周昼间噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

5、固（液）体废物调查结果

项目金属边角料出售给废品回收单位；废包装材料和生活垃圾委托环卫部门清运；固体废物储存、处置能达到《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定。

表 7-6 项目固体废物产生及处置情况一览

| 名称 | 形态 | 属性 | 废物代码 | 3月30日产生量(kg) | 3月31日产生量(kg) | 截止 3.31 暂存量(kg) | 实际年(t) | 设计处理处置方式 | 实际处理处置方式 |
|-------|----|------|------|--------------|--------------|-----------------|--------|--------------|--------------|
| 金属边角料 | 固态 | 一般固废 | / | 6.5 | 6.6 | 10 | 2 | 收集后出售给废品收购单位 | 收集后出售给废品收购单位 |
| 废包装材料 | 固态 | 一般固废 | / | 2.55 | 2.67 | 5 | 0.8 | 委托环卫部门清运处置 | 委托环卫部门清运处置 |
| 生活垃圾 | 固态 | 一般固废 | / | 16.5 | 16.6 | 0 | 5 | 委托环卫部门清运处置 | 委托环卫部门清运处置 |

八、验收监测结论

1、污染物排放监测结果

1.1 废水监测结论

监测结果表明：项目污水总排口 DW001 废水中 pH 值范围、化学需氧量、悬浮物、五日生化需氧量、石油类浓度均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中所要求的三级标准，氨氮、总磷浓度达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）要求。

1.2 废气监测结论

监测结果表明：厂界无组织废气监控点的颗粒物浓度与参照点浓度差值均能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值。

1.3 噪声监测结论

监测结果表明：本项目厂界昼间噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

1.4 固（液）体废物调查结论

项目金属边角料出售给废品回收单位；废包装材料和生活垃圾委托环卫部门清运；固体废弃物储存、处置能达到《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定。

2、总结论

浙江中盟电力设备有限公司年产 800 吨变压器铁芯项目竣工环境保护验收在实施过程和试运行中，按照建设项目环境保护“三同时”的相关要求，根据现场勘查及两天检测数据分析结果，基本落实了环境影响评价文件中要求的相关内容，验收监测结果表明各污染物排放指标均符合相应标准，基本具备建设项目环保设施竣工验收条件，建议通过环保设施竣工验收。

3、其他需要说明的事项和建议要求

（1）其他说明事项

项目建设地点、性质、生产设备、原辅材料和工艺，基本符合环评及批复要求建设完成。根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》判断，本项目无重大变动。

根据纳入排污许可管理的行业和管理类别表，企业属于“登记管理”行业，企业已于

2020 年 7 月 25 日进行排污许可登记，有效期至 2025 年 7 月 24 日。

其他环保措施主要有通过对员工培训，强化员工的环保意识，开展文明生产，以及加强生产设备的的维修与保养，并建立运行台账，确保设备正常运行。

(2) 建议与要求

①平时加强设备的维修与保养，确保设备正常运行，避免产生不必要的噪声影响；

②规范固废收集场所，完善标识标牌。

③建立健全各项企业环保管理规章制度和岗位责任制，建立企业环保台账。加强职工环境安全生产知识教育，落实环境安全生产责任制和污染治理设施维护保养制度，完善风险防范措施。

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

编号：

验收类别：验收监测表

审批经办人：


| | | | | | |
|------------|------------------|----------|-------------------------|-------------|-----------------|
| 建设项目名称 | 年产 800 吨变压器铁芯项目 | 建设地点 | 浙江省丽水市莲都区南明山街道仙霞路 101 号 | | |
| 建设单位 | 浙江中盟电力设备有限公司 | 邮政编码 | 323000 | 电话 | 15057775179 |
| 行业类别 | C3561 电工机械专用设备制造 | 项目性质 | 迁建 | | |
| 建设内容及规模 | 年产 800 吨变压器铁芯 | 建设项目开工日期 | | 2019 年 12 月 | |
| | | 投入试运行日期 | | 2020 年 9 月 | |
| 报告书（表）审批部门 | 丽水市生态环境局 | 文号 | 丽环建备一开[2019]99 号 | 时间 | 2019 年 5 月 29 日 |
| 补充报告书审批部门 | / | / | / | / | / |
| 报告书（表）编制单位 | 浙江中盟电力设备有限公司 | 投资总概算 | 550 万元 | | |
| 环保设施设计单位 | / | 环保投资总概算 | 5 万元 | 比例 | 0.91% |
| 环保设施施工单位 | / | 实际总投资 | 560 万元 | | |
| 环保设施监测单位 | 浙江齐鑫环境检测有限公司 | 环保投资 | 9 万元 | 比例 | 1.61% |
| 废水治理 | 废气治理 | 噪声治理 | 其它（固废，垃圾存放点） | | |
| 1 万元 | 2 万元 | 5 万元 | 2 万元 | | |

污染控制指标

| 控制项目 | 原有排放量 | 新建部分产生量 | 新建部分处理削减量 | 以新带老削减量 | 排放增减量 | 排放总量 | 允许排放量 | 区域削减量 | 处理前浓度 | 纳管排放浓度 | 允许纳管排放浓度 |
|-------|-------|---------|-----------|---------|-------|------|-------|-------|-------|--------|----------|
| 废水 | | | | | | 204 | | | | | |
| 化学需氧量 | | | | | | | | | | | |
| 氨氮 | | | | | | | | | | | |
| 废气 | | | | | | | | | | | |
| 颗粒物 | | | | | | | | | | | |
| 二氧化硫 | | | | | | | | | | | |
| 氮氧化物 | | | | | | | | | | | |
| VOCs | | | | | | | | | | | |
| 固废 | | | | | | | | | | | |

注：括号外为本项目建成后，全厂排放量；括号内为本项目排放量。单位：mg/m³（废气浓度），mg/L（废水浓度），t（排放量）

附件 1：项目所在地示意图

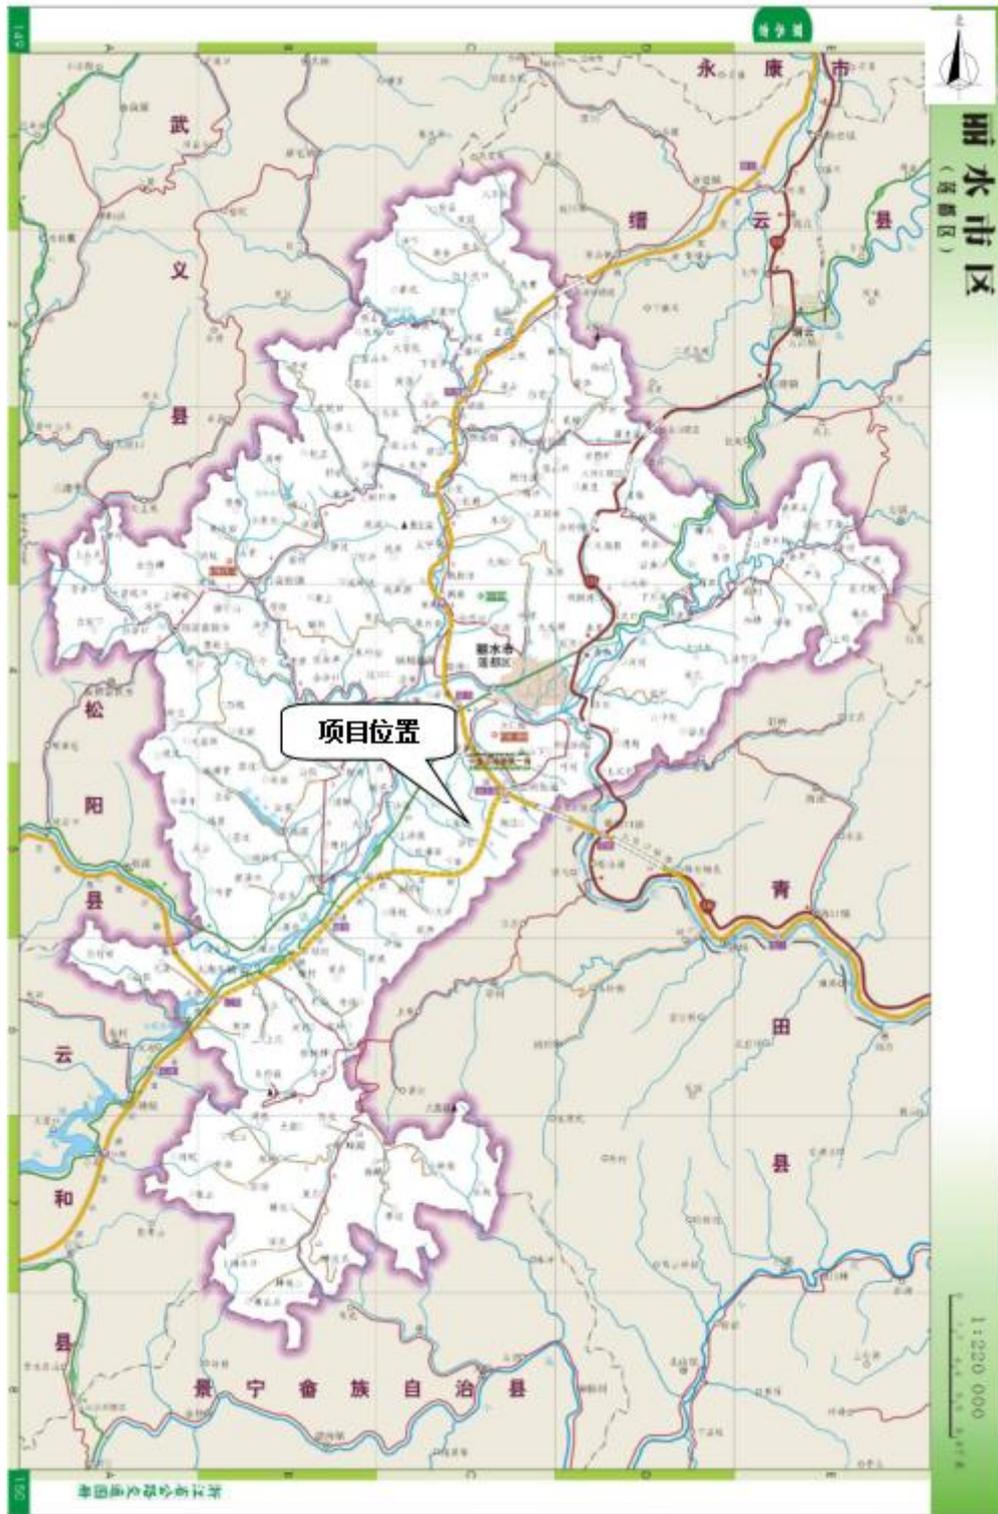

附件 2：审批项目批复

浙江中盟电力设备有限公司年产 800 吨变压器铁芯项目环境影响评价文件 备案通知书

编号：丽环建备-开[2019]99 号

浙江中盟电力设备有限公司：

你单位于 2019 年 5 月 29 日提交的浙江中盟电力设备有限公司年产 800 吨变压器铁芯项目环境影响登记表及建设项目环境影响评价文件备案承诺书、信息公开情况说明等材料收悉，经形式审查，同意备案。

建设项目在投入生产或者使用前，请你单位对照环评及承诺备案的要求，按国务院环境保护主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并向社会公开验收报告。



附件 3：营业执照



营 业 执 照

(副 本)

统一社会信用代码
91331100MA2E148J6G (1/1)

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

| | | | |
|-----------|--|---------|-------------------------|
| 名 称 | 浙江中盟电力设备有限公司 | 注册 资 本 | 伍佰万元整 |
| 类 型 | 其他有限责任公司 | 成 立 日 期 | 2019 年 04 月 08 日 |
| 法 定 代 表 人 | 章杜斌 | 营 业 期 限 | 2019 年 04 月 08 日 至 长 期 |
| 经 营 范 围 | 电力电子元器件、电气成套设备及配件、高低压电器及配件、砂钢片、铁芯、油箱、变压器、五金冲件、配电箱、五金配件、铜线机械制造、加工、销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) | 住 所 | 浙江省丽水市莲都区南明山街道仙霞路 101 号 |

登记机关 

2019 年 04 月 08 日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日通过国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

附件 4：企业排污许可回执

固定污染源排污登记回执

登记编号：91331100MA2E148J6G001X

排污单位名称：浙江中盟电力设备有限公司

生产经营场所地址：浙江省丽水经济技术开发区仙霞路101号

统一社会信用代码：91331100MA2E148J6G

登记类型：首次 延续 变更

登记日期：2020年07月25日

有效期：2020年07月25日至2025年07月24日



浙江中盟电力设备有限公司

年产 800 吨变压器铁芯项目

竣工环境保护验收检查意见

根据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求，2022 年 4 月 24 日，浙江中盟电力设备有限公司邀请相关单位人员及专家组成验收工作组（名单附后），根据浙江齐鑫环境检测有限公司编制的《浙江中盟电力设备有限公司年产 800 吨变压器铁芯项目竣工环境保护设施验收监测表》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告书和审批部门批复文件等要求对本项目进行验收现场检查，提出现场检查意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

浙江中盟电力设备有限公司看好变压器铁芯的市场发展前景，通过投资 560 万元，租用浙江永固输配电设备有限公司位于浙江省丽水市莲都区南明山街道仙霞路 101 号的部分厂房，租用建筑面积为 1134m²。采用先进的生产技术或工艺，购置先进的生产设备，建设年产 800 吨变压器铁芯项目。企业全厂劳动定员约 20 人，一班制作业，每班工作 8 小时，年生产 300 天，厂区内不提供食宿。

项目于 2019 年在丽水经济技术开发区经济发展局登记备案（项目代码：项目代码：2019-331102-44-03-022455-000）。

（二）建设过程及环保审批情况

2019年5月，企业编制了《浙江中盟电力设备有限公司年产800吨变压器铁芯项目环境影响登记表》，并于2019年5月29日取得了丽水市生态环境局《浙江中盟电力设备有限公司年产800吨变压器铁芯项目备案通知书》丽环建备一开[2019]99号文件。

企业已于2020年7月25日进行排污许可登记，有效期至2025年7月24日。

（三）项目环保投资情况

项目实际总投资560万元，其中环保投资合计9万元，占总投资的1.6%。

（四）项目验收范围

为项目的整体验收。

二、工程变动情况

项目建设地点、性质、生产设备、原辅材料和工艺，基本符合环评及批复要求建设完成。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》判断，本项目无重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

厂区雨水经雨水沟进入雨水管网管，外排废水仅为生活污水。项目劳动定员20人，生活污水约产生208t/a。生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准（其中氨氮、总磷排放执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中标准限值）厂区内污水总排口（DW001）进入园区污水管网纳管，后进入由水阁污水处理厂处理达标后排放。

（二）废气

项目裁剪工序产尘较少，均自然沉降，通过加强车间通风，少量粉尘以无组织形式排放。

（三）噪声

本项目噪声主要来源为设备运行时所产生的机械噪声。企业已按环评要求落实了以下噪声防治措施：

（1）选购高效、低噪设备并加强设备日常检修和维护；（2）车间内生产设备合理布局；（3）提倡文明生产，提高员工的环保意识，减少不必要的噪声污染。

（四）固体废物

项目故营运期间产生的固体废弃物主要包括金属边角料、废包装材料、职工生活垃圾。

（1）金属边角料：主要为金工、切料过程产生的金属边角料，产生量约为 2t/a，收集后出售给废品收购单位。

（2）废包装材料：产生于原料拆包，产生量约 0.8t/a。收集后委托环卫部门清运处置。

（3）生活垃圾：生活垃圾产生量为 5t/a。收集后委托环卫部门清运处置。

四、环境保护设施调试效果

根据浙江齐鑫环境检测有限公司编制的《浙江中盟电力设备有限公司年产 800 吨变压器铁芯项目竣工环境保护设施验收监测表》：

1、废水

监测结果表明：项目污水总排口 DW001 废水中 pH 值范围、化学需氧量、悬浮物、五日生化需氧量、石油类浓度均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中所要求的三级标准，氨氮、总磷浓度达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）要求。

2、废气

监测结果表明：厂界无组织废气监控点的颗粒物浓度与参照点浓度差值均能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值。

3、厂界噪声

监测结果表明：本项目厂界昼间噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类标准要求。

4、固体废物

项目金属边角料出售给废品回收单位；废包装材料和生活垃圾委托环卫部门清运；固体废弃物储存、处置能达到《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定。

五、验收检查结论

经现场检查，浙江中盟电力设备有限公司年产 800 吨变压器铁芯项目基本落实了环评报告书和批复文件的环保措施，各类污染物排放基本达到相应标准要求，验收工作组认为，可以通过建设项目竣工环保验收，并按要求公示验收情况。

六、建议及整改意见

1、进一步完善项目环保设施竣工验收相关资料。对照项目“环评文件”，复核项目建成投入运行后的实际生产规模、主要设备、原辅材料、配套环保设施建设情况等相关信息，并作比较分析；完善项目竣工《环保验收监

测表》，充实相关核实、调查信息。

2、规范固体废物管理工作。规范各类固废暂存场所，做好“三防”措施，完善标志标识，严格按照规定程序管理、处置。

3、强化企业内部环保管理，完善环保管理制度；完善各类环保台账；加强环保设施运行、维护管理，规范操作规程，确保各项污染物达标排放。

七、验收人员信息

验收人员信息见附件“浙江中盟电力设备有限公司年产 800 吨变压器铁芯项目环保设施竣工环境保护验收工作组签到表”。

浙江中盟电力设备有限公司验收工作组

2022 年 4 月 24 日

工作组签到单

浙江中盟电力设备有限公司年产800吨变压器铁芯项目 竣工环保验收签到单

会议地点：

时间：2022年4月24日

| 序号 | 姓名 | 单位 | 身份证号码 | 联系电话 | 备注 |
|----|-----|--------------|--------------------|-------------|-----------|
| 1 | 吴云琛 | 浙江中盟电力设备有限公司 | 330321198805080911 | 1561850661 | 验收组组长(业主) |
| 2 | 张永 | 浙江中盟电力设备有限公司 | 330321199312050212 | 1590578808 | 环评单位 |
| 3 | | | | | 环保设施单位 |
| 4 | 叶志 | 浙江中盟电力设备有限公司 | 332501198706135113 | 18057889973 | 验收检测单位 |
| 5 | 张永林 | 浙江中盟电力设备有限公司 | 420106196711255274 | 13567615881 | 专家 |
| 6 | 李群 | 浙江中盟电力设备有限公司 | 332501198112200313 | 13867059177 | 专家 |
| 7 | 李利 | 浙江中盟电力设备有限公司 | 332521197106020421 | 13666568917 | 专家 |
| 8 | 唐茵 | 齐能检测 | 332501199201060425 | 18805886874 | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
